CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA

INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 010-2026-OCI/0341-SVC

VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLASCA
PALLASCA, PALLASCA, ÁNCASH

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PLAZA DE ARMAS DE PALLASCA DEL CENTRO POBLADO DE PALLASCA DEL DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH" CON C.U.I. N° 2704970

PERÍODO DE EVALUACIÓN
DEL 28 DE SETIEMBRE DE 2026 AL 2 DE OCTUBRE DE 2026

TOMO I DE I

CABANA, 7 OCTUBRE DE DE 2026

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 010-2026-OCI/0341-SVC

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PLAZA DE ARMAS DE PALLASCA DEL CENTRO POBLADO DE PALLASCA DEL DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH" CON C.U.I. N° 2704970

ÍNDICE

		N° Pág.
I.	ORIGEN	4
II.	OBJETIVOS	4
III.	ALCANCE	4
IV.	INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD	5
V.	SITUACIONES ADVERSAS	6

1. La Entidad no cautela la permanencia del supervisor de obra conforme a las condiciones establecidas en los términos de referencia y la normativa aplicable, situación que podría afectar el adecuado control técnico, económico y administrativo de la ejecución de la obra
2. La Entidad no cautela el adecuado almacenamiento del cemento y los agregados (arena y piedra), inobservando las especificaciones técnicas y normativa aplicable, generando el riesgo de contaminación de dichos materiales y posibilitando la afectación de la calidad y vida útil del proyecto
3. La Entidad no cautela la implementación de la señalización temporal de seguridad, situación que genera el riesgo de accidentes y posibilita el pago por partidas no ejecutadas o ejecutadas deficientemente, así como la inaplicación de penalidades
4. La Entidad no cautela el registro en el Cuaderno de Incidencias Digital (CDI) de las ocurrencias durante la ejecución de la obra, situación que genera el riesgo de trazabilidad de dichas ocurrencias susceptibles de aplicación de penalidad
5. La Entidad omite el registro de datos obligatorios en el sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), situación que genera el riesgo de afectación a la transparencia en la gestión pública, limitando el control social y el acceso a la información pública

VI.	DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD	24
VII.	INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	24

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

VIII. CONCLUSIÓN 24

IX. RECOMENDACIONES 24

APÉNDICES 26

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 010-2026-OCI/0341-SVC

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PLAZA DE ARMAS DE PALLASCA DEL CENTRO POBLADO DE PALLASCA DEL DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH" CON C.U.I. N° 2704970

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Pallasca, mediante oficio de comunicación de inicio n.° 000259-2026-CG/OC0341 de 28 setiembre de 2026, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0341-2026-010, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Establecer si la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en plaza de armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con Código Único de Inversiones Nº 2704970, se viene desarrollando conforme a lo establecido en el expediente técnico aprobado, estipulaciones contractuales y normativa aplicable.

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

2.2 Objetivo específico

Determinar si la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en plaza de armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con Código Único de Inversiones Nº 2704970, se viene desarrollando conforme a lo establecido en el expediente técnico aprobado, estipulaciones contractuales y normativa aplicable.

III. ALCANCE

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

La Visita de Control se desarrolló a la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en Plaza de Armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con Código Único De Inversión n.° 2704970, el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de Pallasca, que está bajo en ámbito de control del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Pallasca; y que ha sido ejecutado del 28 de setiembre al 2 de octubre de 2026, en el distrito de Cabana, provincia de Pallasca y departamento de Áncash.

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD

4.1 Del Expediente Técnico:

Mediante Orden de Servicio n.° 156 de 17 de octubre de 2025, la Municipalidad Distrital de Pallasca, en adelante la Entidad, contrató a un profesional para el servicio de consultoría destinado a la elaboración del Expediente Técnico de la obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en Plaza de Armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con Código Único De Inversión n.° 2704970, en adelante "la Obra".

Posteriormente, a través de la Resolución de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural n.° 025-2025-MDP/GIDUR-RDMJM de 21 de noviembre de 2025, la Entidad aprobó dicho Expediente Técnico para la ejecución de la Obra.

La ejecución de la Obra se programó bajo la modalidad de Administración Indirecta - Contrata, mediante el sistema de contratación a suma alzada, con un plazo de ejecución de 45 días calendario y un costo total de inversión asciende a S/ 549 618,47, según el detalle siguiente:

CUADRO N° 1
RESUMEN DE COSTO DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO
1.00	COSTO DIRECTO CD	371 408,31
2.00	GASTOS GENERALES EN (9,00%)	33 426,75
3.00	UTILIDAD (5.00%)	18 570,42
3.00	SUB TOTAL DE EJECUCIÓN	423 405,48
4.00	I.G.V. (18,00%)	76 212,99
5.00	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	499 618,47
6.00	EXPEDIENTE TÉCNICO	26 000,00
7.00	SUPERVISOR DE OBRA (4,80366%)	24 000,00
8.00	COSTO TOTAL DE INVERSIÓN	549 618,47

Fuente: Expediente Técnico aprobado con Resolución de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural n.° 025-2025-MDP/GIDUR-RDMJM de 21 de noviembre de 2025
Elaborado por: Comisión de Control.

La descripción del proyecto señala la necesidad de mejorar los servicios de espacios públicos urbanos de la plaza de armas del distrito de Pallasca, considerando que dicho espacio no ha sido objeto de intervenciones similares durante varios años.

De acuerdo con el Expediente Técnico aprobado, las metas físicas comprenden, entre otras, las siguientes:

"(…)
VI. META FÍSICA

Los trabajos a ejecutarse son:
- *Construcción de vereda con concreto F´c = 175 kg/cm2*
- *Instalación de postes de iluminación de las 4 esquinas de la plaza de armas.*
- *Instalación de aspersores para el riego de las áreas verde*
- *Instalación de las farolas ornamentales para iluminación dentro de la plaza,*
- *Revestimiento de piso de terrazo pulido*
- *Instalación de tachos de basuras.*
- *Instalaciones eléctricas y agua*

(…)"

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

4.2 Del contrato de ejecución de obra:

El 30 de julio de 2026, los evaluadores adjudicaron la buena pro de la Licitación Pública Abreviada de Obras n.° 01 – 2025-MDB/CS – Primera convocatoria, para la contratación de ejecución de la Obra, al **CONSORCIO PALLASCA**, en adelante "el Contratista", conformado por las empresas: DAMBEZ COMPANY EIRL con RUC n.° 20542191059 y M&O INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL con RUC n.° 20600623380.

Posteriormente, el 10 de agosto de 2026 la Entidad consintió la buena pro, por lo que el Contratista el 13 de agosto de 2026, presentó los documentos para el perfeccionamiento del contrato; luego, mediante Contrato n.° 001 – 2026-MDP/CS de 19 de agosto de 2026, la Entidad suscribió contrato para la ejecución de la Obra con el Contratista, con un plazo de ejecución de 45 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por administración indirecta (contrata), con sistema de contratación a suma alzada y con monto contractual de S/ 499 618,47 que incluye todos los impuestos de Ley.

4.3 Del supervisor de obra:

Mediante Requerimiento n.° 0004-2026-MDP/GIDUR-MFCC, recibido por la Unidad de Logística el 21 de agosto de 2026, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural solicitó la contratación de los servicios profesionales de un ingeniero civil para el cargo de supervisión de la Obra.

En atención a dicho requerimiento, el 31 de agosto de 2026 la Entidad suscribió la orden de servicios n.° 00128 para la contratación del referido profesional, por un monto de S/24 000,00 y un plazo de ejecución de 45 días calendario; siendo el proveedor T & D Constructores Perú S.R.L., identificado con RUC n.° 20603288697.

4.4 De la ejecución de la obra:

Conforme al "ACTA DE ENTREGA DE TERRENO" y "ACTA DE INICIO DE OBRA", el 11 y 14 de setiembre de 2026, respectivamente, participaron en dichos actos las personas siguientes:

CUADRO N° 2
RELACIÓN DE PARTICIPANTES DE LA ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE OBRA

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	EN REPRESENTACIÓN DE
Elmer Rossvelt Mendoza Támara	Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural	La Entidad
Hebert Juan Guillen Bazán	Supervisor de Obra	La Entidad
Ángelo Mijael Mendoza Montoya	Representante común del CONSORCIO PALLASCA	Del contratista
Miguel Ángel Ruiz Guillen	Residente de Obra	Del contratista

Fuente: Acta de entrega de terreno y acta de inicio de obra, el 11 y 14 de setiembre de 2026, respectivamente.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

V. SITUACIONES ADVERSAS

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

De la revisión de la documentación relacionada con la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en Plaza de Armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con Código Único de Inversión n.° 2704970, se han identificado las situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la Obra, las cuales se exponen a continuación:

1. **LA ENTIDAD NO CAUTELA LA PERMANENCIA DEL SUPERVISOR DE OBRA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA NORMATIVA APLICABLE, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL ADECUADO CONTROL TÉCNICO, ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

De la revisión de la documentación técnica y contractual correspondiente a la supervisión de la obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en plaza de armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con Código Único de Inversiones Nº 2704970, se advierte que para la prestación del servicio de supervisión se previó la participación de un ingeniero civil, con factores de participación establecido en función de su intervención durante el plazo contractual.

Al respecto, mediante orden de servicio n.° 00128, suscrito el 31 de agosto de 2026 entre la Municipalidad Distrital de Pallasca y T & D Constructores Perú S.R.L., con RUC n.° 20603288697, se contrató la supervisión de la referida obra por un monto de S/ 24 000,00 y plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario.

En ese sentido, el personal profesional y técnico previsto para la supervisión de la obra y su respectivo factor de participación se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 3
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Actividad:	Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en Plaza de Armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash					
Cliente:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLASCA					
FECHA:	Nov-25					
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA						
(…)						
II. GASTOS VARIABLES						
Item	**Descripción**					
01.	**Personal técnico administrativo**	**Cantidad**	**Tiempo (meses)**	**% Part.**	**Parcial**	**Sub total S/**
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	Supervisor	1.00	1.00	100,00%	8 000,00	8 000,00
(…)						
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD						**24,000.00**
(…)						

Fuente: Expediente Técnico aprobado con Resolución de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural n.° 025-2025-MDP/GIDUR-RDMJM de 21 de noviembre de 2025
Elaborado por: Comisión de Control.

Siendo así, a efectos de verificar la participación efectiva del supervisor, la Comisión de Control realizó la inspección física en la Obra y **constató,** mediante acta N° 017-2026-OCI/MPP de 23 de setiembre de 2026, **la ausencia del supervisor de obra**.

Al respecto, dicha ausencia evidencia el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en los Términos de Referencia de la orden de servicio n.° 00128 de 31 de agosto de 2026, el cual establece su asistencia diaria y permanente, tal como se transcribe a continuación:

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

"(…)
9.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El supervisor de obra deberá realizar las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES:
- *Dirigir técnica-económica-administrativa la ejecución de la obra.*

(…)
- *Asistir diaria y permanentemente al lugar de la obra a su cargo*

(…)" (Subrayado nuestro)

Como parte de la verificación efectuada, la Comisión de Control registró los datos del personal técnico presente en obra durante la inspección física realizada el 23 de setiembre de 2026, conforme se muestra en la imagen siguiente:

IMAGEN N° 1

Se observa al personal técnico del Contratista presente durante la inspección física realizada el 23 de setiembre de 2026, identificándose, entre otros, al residente de obra, Ingeniera de Seguridad y Salud en el Trabajo, Maestro de obra, y 6 obreros; asimismo, se observa al alcalde del distrito de Pallasca.



Fuente: Acta n.° 017-2026-OCI/MPP de 23 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

De lo expuesto, se advierte que durante la inspección física realizada el 23 de setiembre de 2026 **se constató la ausencia del supervisor de obra**, pese a que su participación es diaria (permanente) conforme a las condiciones contractuales.

Asimismo, de la revisión de la documentación correspondiente al servicio de supervisión se advierte que el referido profesional tiene participación de 100 %, encontrándose su costo comprendido dentro de los gastos generales del servicio; por lo que su participación debía guardar correspondencia con las obligaciones asumidas durante la ejecución contractual.

V°B°
Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

Al respecto, el artículo 187 del Reglamento de la Ley n.° 32069, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 009-2025-EF y sus modificatorias, establece que el supervisor de obra es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y por el cumplimiento del contrato.

En ese contexto, la Comisión de Control advierte que la Entidad no habría cautelado que el servicio de supervisión cuente con la participación del supervisor de obra conforme a los Términos de Referencia; situación que podría afectar el adecuado seguimiento y control técnico, económico y administrativo de la ejecución de la obra, así como generar el riesgo de que se efectúen pagos por servicios cuya prestación efectiva no se encuentre debidamente acreditada y de que no se adopten, de corresponder, las acciones contractuales previstas ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas.

Aunado a lo descrito precedentemente, de la revisión de la documentación proporcionada a través del acta N° 017-2026-OCI/MPP de 23 de setiembre, se advierte que mediante requerimiento N° 0004-2026-MDP/GIDUR-MFCC recibido el 21 de agosto de 2026 por la Unidad de Logística, el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural realizó el requerimiento para la contratación de los servicios de un (1) ingeniero civil para el cargo de supervisión de la obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en Plaza de Armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con Código Único de Inversión n.° 2704970, adjuntando los Términos de Referencia para dicha contratación.

De la revisión de los referidos Términos de Referencia se advierte que **el área usuaria no incluyó el cobro de penalidades por el incumplimiento de las obligaciones contractuales del supervisor** y **solo incluyó penalidad por mora** en los siguientes términos:

> *"(…)*
> ***Penalidad por Mora en la Ejecución de la Prestación***
>
> *En caso de retraso injustificado del **SUPERVISOR DE OBRA**, incumple con brindar el servicio en las condiciones establecidas en el Contrato, **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLASCA** aplicará las penalidades conforme a lo dispuesto en **el Artículo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado***
> *(…)*
> *Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.*
>
> *Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulte imputable".*

Siendo así, en atención al requerimiento formulado, mediante orden de servicio n.° 00128 de 31 de agosto de 2026, la Entidad contrató como supervisor de la Obra al proveedor T & D Constructores Perú S.R.L., identificado con RUC n.° 20603288697.

No obstante, es de advertir que la citada orden de servicio consideró los TDR del requerimiento formulado por la gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, en las que **únicamente se incluyó penalidad por mora y no se incluyó otras penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.**



Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00



Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00



Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

En ese contexto, la ausencia del supervisor durante la ejecución de los trabajos evidencia un incumplimiento contractual por parte de este, de acuerdo a las condiciones establecidas en los Términos de Referencia para su contratación; no obstante, la no inclusión de penalidades por incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales genera que dicho supervisor no asuma sus responsabilidades por la ejecución integral de la obra y la inaplicación de penalidades por parte de la Entidad.

a) Criterio:

- **Reglamento de la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado con Decreto Supremo n.° 009-2025-EF, vigente desde el 22 de abril de 2025 y sus modificatorias**

  "(…)
  TÍTULO III
  DISPOSICIONES GENERALES A BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.
  CAPÍTULO I
  ACTUACIONES PREPARATORIAS
  (…)
  SUBCAPÍTULO 1
  Segmentación de contrataciones y elaboración de requerimientos
  (…)
  Artículo 44. Requerimiento
  44.1. Al determinar sus requerimientos las entidades contratantes atienden una necesidad para el cumplimiento de la finalidad pública, promoviendo el valor por dinero.
  44.2. El área usuaria remite el requerimiento a la DEC. El requerimiento contiene las condiciones de contratación, que incluyen como mínimo lo siguiente, de corresponder:
  a) El alcance de la contratación, y las condiciones de ejecución, en función de su desempeño y funcionalidad.
  (…)
  CAPÍTULO V
  DISPOSICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
  SUBCAPÍTULO 3
  Incumplimiento del contrato
  Artículo 119. Penalidades
  119.1. El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.
  Artículo 187. Funciones de la supervisión de obras y consultorías de obras.
  (…)
  187.1. La supervisión es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación y del cumplimiento del contrato. La supervisión se ajusta a lo señalado en el contrato, y no tiene la facultad de realizar modificaciones al mismo.
  (…)"

- **Términos de Referencia para la "Contratación de los servicios profesional de un (01) ingeniero civil para el cargo de supervisión de obra" "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en plaza de armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con Código Único de Inversión n.° 2704970**

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

"(…)
OBLIGACIONES GENERALES:
Dirigir técnica-económica-administrativa la ejecución de la obra.
(…)
Asistir diaria y permanentemente al lugar de la obra a su cargo
(…)"

b) Consecuencia:

La situación descrita genera el riesgo de afectar el adecuado control técnico, económico y administrativo de la ejecución de la obra.

2. LA ENTIDAD NO CAUTELA EL ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO Y LOS AGREGADOS (ARENA Y PIEDRA), INOBSERVANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVA APLICABLE, GENERANDO EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE DICHOS MATERIALES Y POSIBILITANDO LA AFECTACIÓN DE LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

a) Condición:

Durante la inspección física realizada a la Obra, según consta en el acta N° 017-2026-OCI/MPP de 23 de septiembre de 2026, la Comisión de Control constató las siguientes observaciones respecto al almacenamiento de materiales, según se detalla a continuación:

- **Respecto al almacenamiento del cemento:**

Se verificó un lote de bolsas de cemento de la marca "CEMEX Tipo I" acopiado a la intemperie, cubierto precariamente con plástico azul, expuesto a la humedad del entorno geográfico y sin el aislamiento adecuado respecto al suelo natural (apoyado sobre paneles fenólicos directamente sobre la superficie). Asimismo, se constató una (1) envoltura de bolsa de cemento húmeda y dos (2) bolsas de cemento rotas, como se muestra en las imágenes siguientes:

IMAGEN N° 2
BOLSAS DE CEMENTO ROTAS Y CON PRESENCIA DE HUMEDAD



Fuente: Acta n.° 017-2026-MDP/OCI de 23 de setiembre del 2026.

IMAGEN N° 3
BOLSAS DE CEMENTO ACOPIADO A LA INTEMPERIE



Fuente: Acta n.° 017-2026-MDP/OCI de 23 de setiembre del 2026.

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

- **Respecto al almacenamiento de los agregados:**

  Se observó que el agregado fino (arena) y el agregado grueso (piedra) se encuentran acopiados a la intemperie en contacto directo con el terreno natural, sin ningún tipo de protección o delimitación que evite su contaminación con material orgánico (presencia de hierba y tierra circundante), como se muestra en las imágenes siguientes:

IMAGEN N° 4
AGREGADO FINO A LA INTEMPERIE Y EN CONTACTO DIRECTO CON TERRENO NATURAL



Fuente: Acta n.° 017-2026-MDP/OCI de 23 de setiembre del 2026.

IMAGEN N° 5
AGREGADO GRUESO A LA INTEMPERIE Y EN CONTACTO DIRECTO CON TERRENO NATURAL



Fuente: Acta n.° 017-2026-MDP/OCI de 23 de setiembre del 2026.

De lo expuesto, se evidencia que la Entidad no cautela el adecuado almacenamiento del cemento y de los agregados que serán utilizados para la ejecución de la obra; en tal sentido, el residente y el supervisor, no vienen cumpliendo con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado y normativa aplicable, respecto al almacenamiento de materiales.

Es de precisar que la exposición a la humedad del cemento compromete su uso en obra; asimismo, el contacto directo de los agregados con el terreno natural y hierba lo contamina y compromete su utilización en obra, conforme a Reglamento Nacional de Edificaciones.

b) Criterio:

- **Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, de 24 de junio de 2024 y vigente desde el 22 de abril de 2025**

  "(…)
  TÍTULO IV
  PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
  (…)
  CAPÍTULO III
  EJECUCIÓN CONTRACTUAL
  SUBCAPÍTULO I
  Ejecución contractual
  (…)

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

Artículo 69. Responsabilidades relacionadas con la ejecución contractual
69.1. La entidad contratante y el contratista son responsables de ejecutar correcta y oportunamente la totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato. Para ello, deben realizar todas las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia, orientadas al logro de los resultados acordados
(…)"

- **Reglamento de la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 009-2025-EF, vigente desde el 22 de abril de 2025 y sus modificatorias**

"(…)
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRA
(…)
SUBCAPÍTULO 6
Supervisión
(…)
Artículo 187. Funciones de la supervisión de obras y consultorías de obras
187.1. La supervisión es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación y del cumplimiento del contrato. La supervisión se ajusta a lo señalado en el contrato, y no tiene la facultad de realizar modificaciones al mismo.
(…)"

- **Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA de 8 de mayo de 2006 y sus modificatorias**

"(…)
NORMA E.060
CONCRETO ARMADO
CAPÍTULO 3
MATERIALES
(…)
3.3 AGREGADOS
(…)
3.3.4 Los agregados fino y grueso deberán ser manejados como materiales independientes. Cada una de ellos deberá ser procesado, transportado, manipulado, almacenado y pesado de manera tal que la pérdida de finos sea mínima, que mantengan su uniformidad, que no se produzca contaminación por sustancias extrañas y que no se presente rotura o segregación importante en ellos.
(…)
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
3.7.1 El material cementante y los agregados deben almacenarse de tal manera que se prevenga su deterioro o la introducción de materias extrañas.
3.7.2 Ningún material que se haya deteriorado o contaminado debe utilizarse en la elaboración del concreto.
3.7.3 Para el almacenamiento del cemento se adoptarán las siguientes precauciones:
(a) No se aceptarán en obra bolsas de cemento cuyas envolturas estén deterioradas o perforadas.

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

(b) El cemento en bolsas se almacenará en obra en un lugar techado, fresco, libre de humedad, sin contacto con el suelo. Se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material plástico u otros medios de protección.

(…)"

- **Expediente Técnico de obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en Plaza de Armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con C.U.I. n.° 2704970, aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 043-2026-MDP/A de 6 de julio de 2026**

"(…)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(…)
MATERIALES
(…)
Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en obra en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados:
(…)
El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no desmejore las propiedades de estos, ubicándolos en lugares adecuados, tanto para su descarga, protección, así como para su despacho.
(…)"

c) Consecuencia:

La situación descrita genera el riesgo de contaminación del cemento y agregados (arena y piedra), posibilitando la afectación de su calidad y la consiguiente vida útil del proyecto.

3. LA ENTIDAD NO CAUTELA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE ACCIDENTES Y POSIBILITA EL PAGO POR PARTIDAS NO EJECUTADAS O EJECUTADAS DEFICIENTEMENTE, ASÍ COMO LA INAPLICACIÓN DE PENALIDADES

a) Condición:

Durante la inspección física realizada a la Obra, según consta en el acta N° 017-2026-MDP/OCI de 23 de setiembre del 2026, la Comisión de Control constató la falta de implementación de la señalización temporal para los límites de seguridad de la obra, límite de circulación vehicular y/o peatonal, tales como paneles, tranquera tipo varando, cono de fibra de vidrio fosforescente, cinta de señalización amarilla y soporte para cinta señalizadora, a lo largo del perímetro de intervención en la plaza de armas del distrito de Pallasca, conforme se evidencia en las imágenes siguientes:

……..……Imágenes en la página siguiente……..……

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

IMAGEN N° 6
AUSENCIA DE SEÑALIZACIÓN



Fuente: Acta n.° 017-2026-MDP/OCI de 23 de setiembre del 2026.


IMAGEN N° 7
AUSENCIA DE SEÑALIZACIÓN



Fuente: Acta n.° 017-2026-MDP/OCI de 23 de setiembre del 2026.

Asimismo, se encontró una canaleta o buzón que atraviesa el área de trabajo, la cual se encuentra descubierta, sin tapa de protección y carente de señalización temporal en su recorrido, manteniendo la zona expuesta a riesgos de caídas y accidentes, tal como se evidencia en el plano de ubicación que muestra la trayectoria de dicha canaleta, conforme la siguiente imagen:

IMAGEN N° 8
CANALETA O BUZÓN DESCUBIERTA

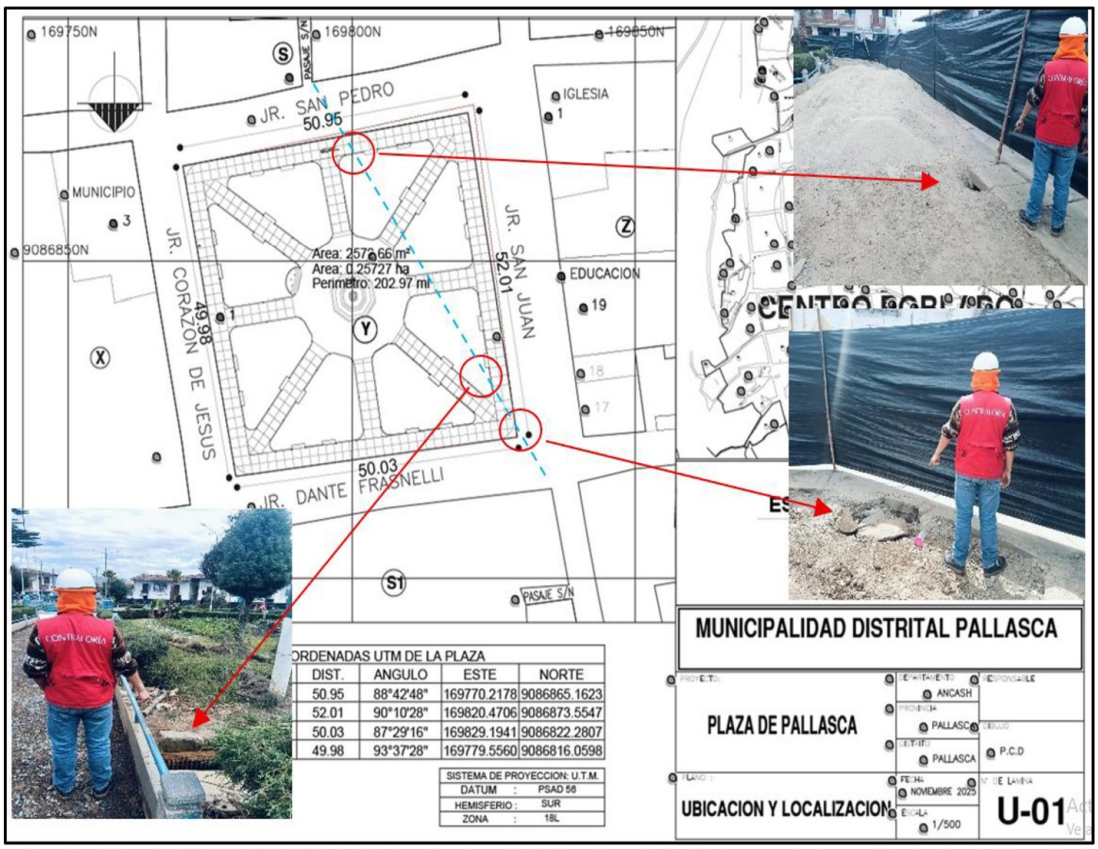

Fuente: Acta n.° 017-2026-MDP/OCI de 23 de setiembre del 2026 y Expediente Técnico aprobado con Resolución de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural n.° 025-2025-MDP/GIDUR-RDMJM de 21 de noviembre de 2025

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

De lo expuesto, se advierte que la ausencia de señalización temporal de seguridad se encuentra comprendida en el supuesto contractual de aplicación de penalidad, conforme a las condiciones previstas en el contrato; además, posibilita la ocurrencia de accidentes dentro y fuera de la obra, incumpliendo las disposiciones del Expediente Técnico aprobado y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

b) Criterio:

- **Reglamento de la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 009-2025-EF, vigente desde el 22 de abril de 2025 y sus modificatorias**

"(…)
Artículo 187. Funciones de la supervisión de obras y consultorías de obras
187.1. La supervisión es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación y del cumplimiento del contrato. La supervisión se ajusta a lo señalado en el contrato, y no tiene la facultad de realizar modificaciones al mismo.
(…)

- **Norma G.050 Seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 8 de mayo de 2006, y modificado con Decreto Supremo n.° 010-2009-VIVIENDA, publicado el 9 de mayo de 2009**.

"(…)
7. REQUISITOS DEL LUGAR DE TRABAJO
El Lugar de trabajo deberá reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y terceras personas, para tal efecto se debe considerar.
(…)
7.5 Tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes
Se tomarán todas las acciones necesarias para proteger a las personas que transiten por las distintas áreas y sus inmediaciones, de todos los peligros que puedan derivarse de las actividades desarrolladas.
(...)
7.7 Señalización
Siempre que resulte necesario se deben adoptar las medidas necesarias y precisas para que la obra cuente con la suficiente señalización.

Se considera señalización de seguridad y salud en el trabajo, a la que, referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación relativa a la seguridad y salud del trabajador o a una situación de emergencia, mediante una señal en forma de panel, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda.
(…)
Se deben señalizar los sitios de riesgo indicados por el prevencionista, de conformidad a las características de señalización de cada caso en particular. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riegos emergentes.
(...)"

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

- **Expediente Técnico de obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en Plaza de Armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con C.U.I. n.° 2704970, aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 043-2026-MDP/A de 6 de julio de 2026**

  "(…)
  III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
  (…)
  01.03. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
  (…)
  01.03.02 SEÑALIZACIÓM TEMPORAL DE SEGURIDAD
  (…)
  Esta partida considera todos los trabajos de señalización para los límites de seguridad de la obra o límite de circulación vehicular o peatonal, dando seguridad a la ejecución plena del mantenimiento en las áreas que se estén realizando los trabajos respectivos. Los trabajos incluyen:
  - *El mantenimiento de los desvíos que sean necesarios para facilitar las tareas de mantenimiento de líneas de señalización.*
  - *La implementación e instalación de dispositivos de control de tránsito y seguridad acorde a las distintas fases de la operación.*
  - *En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones que sean requeridos para garantizar la seguridad y conforme al público usuario erradicando cualquier incomodidad y molestias que puedan ser ocasionadas por diferentes servicios de mantenimiento y seguridad vial. Esta partida también comprende la fabricación y colocación de paneles informativos presentando una señalización de acuerdo al tipo de obra en ejecución, así como llamar la atención de los transeúntes y moradores.*

  Estos paneles serán de madera con planchas de triplay indicando claramente gráficos, símbolos, señales y otros datos necesarios para la información y conocimiento público del mantenimiento. Su colocación se realizará al inicio y a medida del avance de los trabajos con previa verificación de la Inspección o Supervisión.
  (…)
  Esta partida también considera la mano de obra, materiales y equipo necesario para la colocación de tranqueras tipo varando, conos de fibra de vidrio, soporte de cinta señalizador y cinta señalizadora para protección de la obra en ejecución
  (…)"

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

- **Contrato de obras N° 001-2026-MDP-GM/WG, Contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en plaza de armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con Código Único Inversión N° 2704970, suscrito el 19 de agosto de 2026**

  "(…)
  CLÁUSULA DECIMOQUINTA: PENALIDADES
  (…)

OTRAS PENALIDADES			
N°	***SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD***	***FORMA DE CÁLCULO***	***PROCEDIMIENTO***
(…)			

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

4	***SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN*** *Cuando en contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal vehicular incumpliendo las normas y el expediente técnico.* *Los dispositivos o las señales peatonales y/o vehicular y otros son los que se encuentran detallados en el Expediente Técnico.*	*Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de incumplimiento*	*Según informe del supervisor o inspector.*
(…)			

(…)"

c) Consecuencia:

La situación descrita genera el riesgo de ocurrencia de accidentes dentro y fuera de la obra, asimismo, posibilita el pago por partidas no ejecutadas o ejecutadas deficientemente, así como la inaplicación de las penalidades contractuales correspondientes.

4. LA ENTIDAD NO CAUTELA EL REGISTRO EN EL CUADERNO DE INCIDENCIAS DIGITAL (CDI) DE LAS OCURRENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE TRAZABILIDAD DE DICHAS OCURRENCIAS SUSCEPTIBLES DE APLICACIÓN DE PENALIDAD

a) Condición:

Durante la inspección física realizada a la Obra, según consta en el acta N° 017-2026-MDP/OCI de fecha 23 de septiembre de 2026, la Comisión de Control constató que no se cuenta con un Cuaderno de Incidencias Físico ni digital.

Al respecto, el residente de obra manifestó que: *"el cuaderno de incidencias digital se encuentra en trámite"*.

Al respecto, se advierte que, no se habría efectuado el registro de apertura del Cuaderno de Incidencias ni de las ocurrencias y demás anotaciones correspondientes a la ejecución de la obra.

Lo descrito precedentemente, se evidencia en la verificación efectuada al 29 de septiembre de 2026 en el Cuaderno de Incidencias Digital de la plataforma del OECE, el cual arroja un total de cero registros ("No se encontraron resultados"), para dicha obra, tal como se muestra en la imagen siguiente:


……Imagen en la página siguiente……..

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

IMAGEN N° 9
CUADERNO DE OBRA DIGITAL DEL OECE SIN REGISTRO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

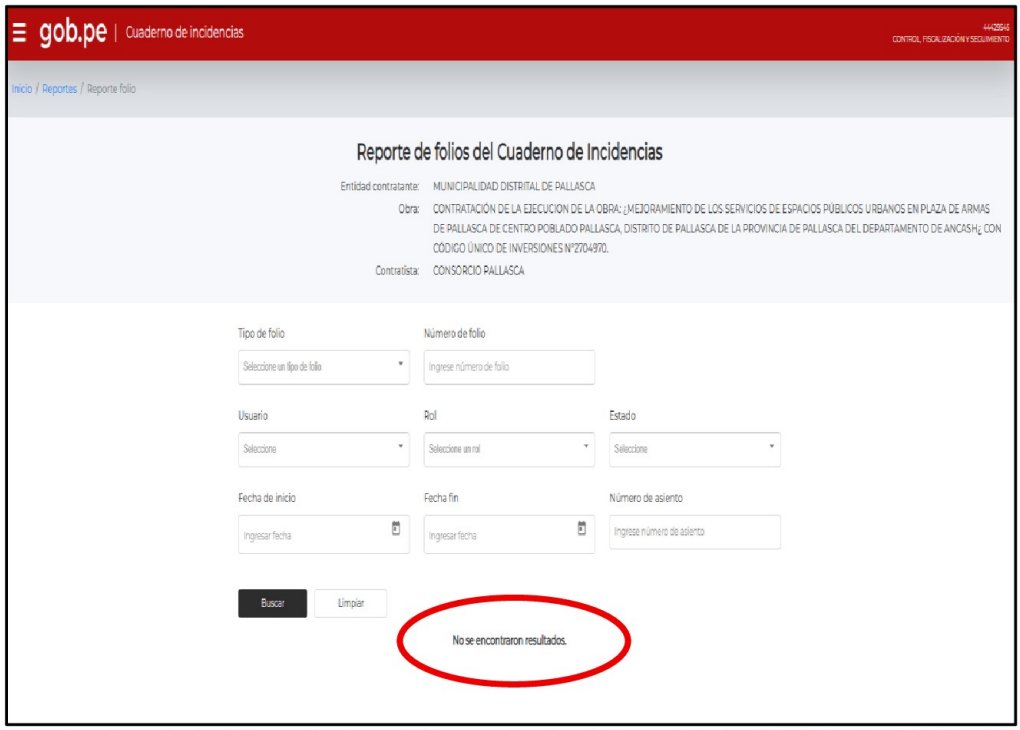

Fuente: Consulta realizada el 29 de setiembre de 2026, en la dirección electrónica siguiente: https://apps.oece.gob.pe/cuaderno-obra/consultas/reporte-folios/20232936097/f920d5ea-b655-4823-8e81-c3bab2475857

En ese sentido, se evidencia una clara falta de control por parte de la supervisión, la cual no solo ha permitido el avance de los trabajos sin exigir dichos registros obligatorios, sino que además omite informar y aplicar las penalidades que le competen.

En tal sentido, se advierte que la Entidad y sus contratistas no estarían utilizando ni el Cuaderno de Incidencias Digital ni un cuaderno físico autorizado, inobservando las disposiciones establecidas en la Directiva N° 017-2025-OECE-CD, la cual regula el uso obligatorio de esta herramienta digital vinculada al SEACE para garantizar la transparencia, inalterabilidad y trazabilidad de los hechos durante la ejecución de obras.

Asimismo, esta inacción configura la causal para la aplicación de la penalidad prevista en el contrato de ejecución: "*Por no estar al día en los asientos que corresponden de acuerdo al avance de obra*" (equivalente al uno por dos mil - 1/2000 del monto de la valorización del periodo por cada evento).

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

b) Criterio:

- **Directiva n.° 017-2025-OECE-CD, Directiva de disposiciones sobre el uso del Cuaderno de Incidencias, aprobado con Resolución n.° D000070-2025-OECE-PRE de 9 de octubre de 2025.**

  "(…)
  II. OBJETO

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

Establecer disposiciones sobre el registro y acceso a las anotaciones en el cuaderno de incidencias, de los principales hechos que ocurren durante la ejecución del contrato para la elaboración del expediente técnico, la ejecución de obras y la supervisión de dichas prestaciones; en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, regímenes especiales y demás normativa que establezca la obligatoriedad de su registro en el cuaderno de incidencias.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Directiva es de cumplimiento obligatorio para:

(…)

- *Los contratistas que ejecutan las referidas prestaciones.*
- *Las entidades que realizan labores de supervisión, control y fiscalización de los procesos de contratación.*

(…)

V. DEFINICIONES

(…)

b. Cuaderno de incidencias: Es la herramienta digital que forma parte de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop), y se encuentra vinculada e integrada al SEACE. A través de esta herramienta los usuarios autorizados registran y acceden a las anotaciones de los principales hechos que ocurren durante la ejecución del contrato para la elaboración del expediente técnico, la ejecución de obras y la supervisión de dichas prestaciones. Las anotaciones también comprenden: los trabajos o partidas a realizarse, las consultas y sus respuestas, las anotaciones que sustenten modificaciones contractuales, entre otras.

(…)

IX. DISPOSICIONES GENERALES

9.1 El CDI constituye la herramienta digital a través del cual se registran las anotaciones de los principales hechos que ocurren durante la ejecución del contrato para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, así como de la supervisión de estas prestaciones, además de los trabajos o partidas a realizarse, las consultas y sus respuestas, las anotaciones que sustenten modificaciones contractuales, entre otras anotaciones, de conformidad con lo previsto en el Reglamento

(…)"

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

- **Contrato de obras N° 001-2026-MDP-GM/WG, Contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en plaza de armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con Código Único Inversión N° 2704970, suscrito el 19 de agosto de 2026**

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

"(…)

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: PENALIDADES

(…)

OTRAS PENALIDADES			
N°	***SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD***	***FORMA DE CÁLCULO***	***PROCEDIMIENTO***
(…)			
28	***CUADERNO DE INCIDENCIAS*** *Por no estar al día en los asientos que*	*Uno por dos mill (1/2000) del monto de la valorización*	*Según informe del supervisor o inspector.*

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

	corresponden de acuerdo al avance de obra.	*del periodo por cada día de incumplimiento*	
(…)			

(…)"

c) Consecuencia:

La situación descrita genera el riesgo de trazabilidad de las ocurrencias durante la ejecución de la obra, las mismas que están sujetas a la aplicación de penalidad.

5. LA ENTIDAD OMITE EL REGISTRO DE DATOS OBLIGATORIOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS), SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE AFECTACIÓN A LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, LIMITANDO EL CONTROL SOCIAL Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

a) Condición:

De la revisión efectuada al Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS al 30 de septiembre de 2026, se advierte que la Entidad registró la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en plaza de armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" (Código Infobras 556783 y código SNIP 2704970); sin embargo, **se verifica que el sistema muestra la obra con el estado "SIN EJECUCIÓN" y con un avance fisico del 0%**, conforme se muestra en la imagen siguiente:


Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

……Imagen en la página siguiente……

IMAGEN N° 10
INFOBRAS SIN INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

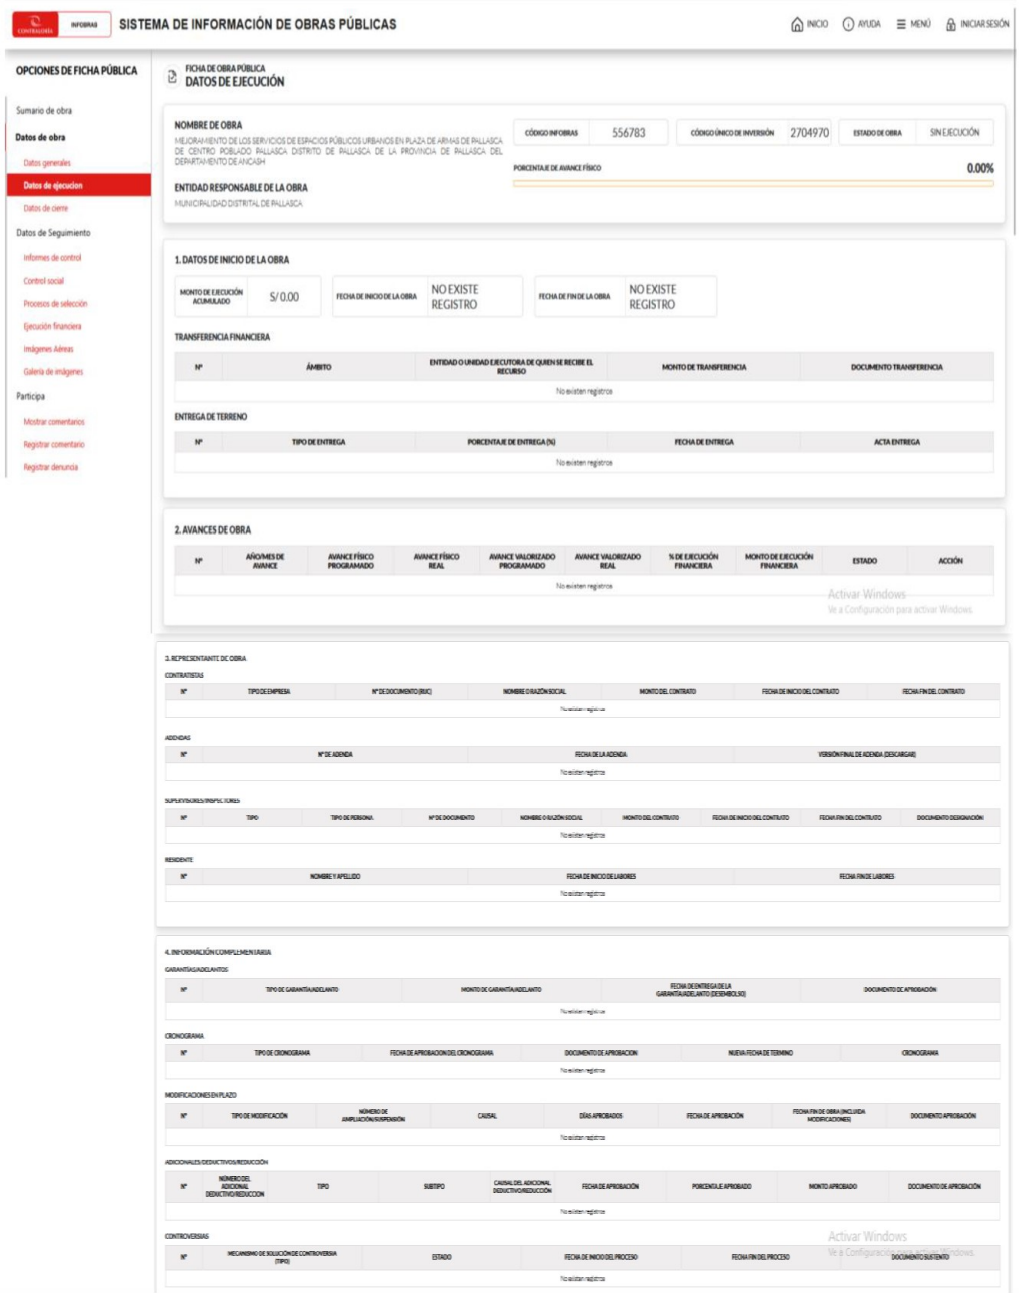

Fuente: Consulta realizada el 29 de setiembre de 2026, en la dirección electrónica siguiente: https://infobras.contraloria.gob.pe/InfobrasWeb/Mapa/Sumario?ObraId=556783

Al respecto, es de precisar que el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) es la herramienta oficial de la Contraloría General de la República de uso obligatorio para las entidades públicas, diseñada para registrar, articular y hacer seguimiento a la ejecución, avances y variaciones de las obras. Su gestión oportuna, conforme a la Directiva N° 005-2023-CG/GMPL, coadyuva a la transparencia, al fortalecimiento del control gubernamental y a la promoción de la participación y control social.

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

De lo expuesto y de la revisión del sistema, se observa que, pese a que el inicio de la ejecución de la obra fue el 14 de septiembre de 2026, la Entidad no ha registrado la información obligatoria de inicio de obra, tales como la fecha de inicio, datos del contrato y del contratista, así como la designación del supervisor y residente de obra, manteniendo la obra con estado "Sin ejecución" e impidiendo que se active la publicación y difusión inicial de la información para el control ciudadano.

b) Criterio:

- **Directiva N° 005-2023-CG/GMPL "Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS", aprobada con Resolución de Contraloría N° 185-2023-CG de 19 de mayo de 2023**

"(…)
6.4. Responsabilidades
(…)
a) Entidades públicas a cargo de la ejecución de obras públicas
Las entidades públicas que intervienen de modo directo o indirecto en la ejecución de las obras públicas son responsables de:
- *Registrar, verificar y mantener actualizada la información requerida por INFOBRAS, debiendo proveer los recursos humanos y tecnológicos necesarios.*

(…)
6.6. Del acceso a la información publicada en el INFOBRAS
La ciudadanía y la sociedad civil organizada en general acceden a la información publicada en el INFOBRAS a fin de tomar conocimiento del estado de la ejecución de las obras públicas a nivel nacional, pudiendo registrar información o comentarios respecto de las obras públicas, ejerciendo de tal forma el control social sobre las mismas.
(…)
7.4. Registro de información de obras públicas
7.4.1. Datos e información de las obras públicas
(…)
7.4.1.2. Datos de ejecución física y financiera
Corresponde a los datos de avances de obra, incluyendo las fechas de inicio y finalización, y documentación de inicio de obra; asimismo, incluye la información de la entrega de terreno, datos del contratista y contrato; datos del supervisor y residente de obra; datos de los adelantos de obra; cronograma de obra; avances mensuales, indicando las paralizaciones o suspensiones que se produzcan; modificaciones de plazo; presupuesto modificado de la obra; adicionales y deductivos; y controversias.
Las entidades públicas tienen la obligación de verificar y actualizar el estado situacional de las obras públicas a su cargo, conforme la documentación requerida por el INFOBRAS.
El registro y publicación de los avances de obra y el estado situacional de la obra, debe realizarse en forma mensual y como máximo el último día hábil del mes siguiente de efectuado el avance.
(…)
7.5. Publicación y difusión de la información de obras públicas Consiste en la publicación de los contenidos relacionados a las obras públicas para que la ciudadanía pueda consultar, acceder, descargar, utilizar o compartir los datos e información, promoviendo los principios de transparencia y acceso a la información pública, participación ciudadana, rendición de cuentas, integridad pública, tecnología e innovación. La información de las obras públicas se publica cuando la entidad completa el registro de la ficha de datos generales.
(...)"

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

c) Consecuencia:

La situación descrita, genera el riesgo de afectación a la transparencia en la gestión; limitando el control social y el acceso a la información pública.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Visita de Control a la ejecución de la obra, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, las cuales han sido señaladas en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución de la presente Visita de Control, la Comisión de Control no ha emitido ningún Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución de la Visita de Control a la obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en plaza de armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con C.U.I. n.° 2704970, se han advertido cinco (5) situaciones adversas que afectan o podrían afectar el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la obra, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Control a la obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en plaza de armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con C.U.I. n.° 2704970, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la obra.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Pallasca, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Cabana, 7 de octubre de 2026

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-10-2026 16:32:37 -05:00

José Antonio Ramirez Paccioni
Supervisor
Comisión de Control

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-10-2026 16:11:31 -05:00

Fernando Roberto Ponce Arroyo
Jefe de Comisión
Comisión de Control

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-10-2026 16:11:59 -05:00

Fernando Roberto Ponce Arroyo
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Pallasca

APÉNDICE N° 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL

1. **LA ENTIDAD NO CAUTELA LA PERMANENCIA DEL SUPERVISOR DE OBRA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA NORMATIVA APLICABLE, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL ADECUADO CONTROL TÉCNICO, ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

N°	Documento
1	Acta n.° 017-2026-OCI/MPP de 23 de setiembre de 2026.
2	Orden de Servicio n.° 00128, suscrito el 31 de agosto de 2026
3	Términos de Referencias para la "Contratación de los servicios profesionales de un (01) ingeniero civil para el cargo de supervisión de obra" "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en plaza de armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con Código Único de Inversión N° 2704970
4	Expediente Técnico aprobado con Resolución de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural n.° 025-2025-MDP/GIDUR-RDMJM de 21 de noviembre de 2025

2. **LA ENTIDAD NO CAUTELA EL ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO Y LOS AGREGADOS (ARENA Y PIEDRA), INOBSERVANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVA APLICABLE, GENERANDO EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE DICHOS MATERIALES Y POSIBILITANDO LA AFECTACIÓN DE LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DEL PROYECTO**

N°	Documento
1	Acta n.° 017-2026-OCI/MPP de 23 de setiembre de 2026.
2	Acta de inicio obra de 14 de setiembre de 2026.
3	Contrato de obras N° 001-2026-MDP-GM/WG, contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en plaza de armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash" con Código Único de Inversión N° 2704970, suscrito el 19 de agosto de 2026
4	Expediente Técnico aprobado con Resolución de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural n.° 025-2025-MDP/GIDUR-RDMJM de 21 de noviembre de 2025

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

3. **LA ENTIDAD NO CAUTELA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE ACCIDENTES Y POSIBILITA EL PAGO POR PARTIDAS NO EJECUTADAS O EJECUTADAS DEFICIENTEMENTE, ASÍ COMO LA INAPLICACIÓN DE PENALIDADES**

N°	Documento
1	Acta n.° 017-2026-OCI/MPP de 23 de setiembre de 2026.
2	Expediente Técnico aprobado con Resolución de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural n.° 025-2025-MDP/GIDUR-RDMJM de 21 de noviembre de 2025

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

4. **LA ENTIDAD NO CAUTELA EL REGISTRO EN EL CUADERNO DE INCIDENCIAS DIGITAL (CDI) DE LAS OCURRENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE TRAZABILIDAD DE DICHAS OCURRENCIAS SUSCEPTIBLES DE APLICACIÓN DE PENALIDAD**

N°	Documento
1	Acta n.° 017-2026-OCI/MPP de 23 de setiembre de 2026.
2	Consulta realizada el 29 de setiembre de 2026, en la dirección electrónica siguiente: https://apps.oece.gob.pe/cuaderno-obra/consultas/reporte-folios/20232936097/f920d5ea-b655-4823-8e81-c3bab2475857

5. **LA ENTIDAD OMITE EL REGISTRO DE DATOS OBLIGATORIOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS), SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE AFECTACIÓN A LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, LIMITANDO EL CONTROL SOCIAL Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

N°	Documento
1	Acta n.° 017-2026-OCI/MPP de 23 de setiembre de 2026.
2	Consulta realizada el 29 de setiembre de 2026, en la dirección electrónica siguiente: https://infobras.contraloria.gob.pe/InfobrasWeb/Mapa/Sumario?ObraId=556783

V°B°
Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:32:12 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:10:38 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 16:11:05 -05:00

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-10-2026 16:26:19 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Cabana, 07 de Octubre de 2026

OFICIO N° 000263-2026-CG/OC0341

Señor:
Rolando Luis Acosta Blas
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital de Pallasca
Jr. San Martín S/N
Ancash/Pallasca/Pallasca

Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control n.° 010-2026-OCI/0341-SVC

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

Previo cordial saludo, me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultaneo y establece la comunicación al Titular de la Entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en plaza de armas de Pallasca del centro poblado de Pallasca del distrito de Pallasca - provincia de Pallasca - departamento de Áncash", con Código Único de Inversión n.º 2704970, comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 010-2026-OCI/0341-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Pallasca, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a la situación adversa identificada en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Fernando Roberto Ponce Arroyo
Jefe del Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Pallasca
Contraloría General de la República

(FPA)

Nro. Emisión: 00299 (0341 - 2026) Elab:(U64088 - 0341)

96 AÑOS 1930 - 2026

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **WFBHBLU**

Firmado digitalmente por PONCE ARROYO Fernando Roberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-10-2026 16:47:36 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000146-2026-CG/0341

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 000263-2026-CG/OC0341
EMISOR	:	FERNANDO ROBERTO PONCE ARROYO - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO	:	ROLANDO LUIS ACOSTA BLAS
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLASCA
DIRECCIÓN	:	CASILLA ELECTRÓNICA N° 20232936097
TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO	:	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° FOLIOS	:	28

Sumilla: Previo cordial saludo, a través del presente se notifica el oficio N° 000263-2026-CG/OC0341 de 7 de octubre de 2026, mediante el cual se notifica el Informe de Visita de Control n.° 010-2026-OCI/0341-SVC para la atención correspondiente.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000263-2026-OC0341
2. Informe_Visita_Control_N° 010-2026-OCI-0341-SVC

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **ASMXMDP**

Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-10-2026 16:49:35 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 000263-2026-CG/OC0341
EMISOR	:	FERNANDO ROBERTO PONCE ARROYO - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO	:	ROLANDO LUIS ACOSTA BLAS
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLASCA

Sumilla:

Previo cordial saludo, a través del presente se notifica el oficio N° 000263-2026-CG/OC0341 de 7 de octubre de 2026, mediante el cual se notifica el Informe de Visita de Control n.° 010-2026-OCI/0341-SVC para la atención correspondiente.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20232936097**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000146-2026-CG/0341
2. OFICIO-000263-2026-OC0341
3. Informe_Visita_Control_N° 010-2026-OCI-0341-SVC

NOTIFICADOR : FERNANDO ROBERTO PONCE ARROYO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **AZL02G7**
